

【定点カメラ（敷地北側より）】



石岡市新庁舎建設工事

【進捗状況 No.02】

平成29年8月15日現在


～基礎部分の工事に着手～

杭工事が終わり、現在基礎部分の工事に取りかかっています。

工事区画を分割し、各工区毎に

「①掘削→②型枠→③捨てコン→④鉄筋」の工程を順次行い、効率的に作業を進めていきます。

今後は、基礎コンクリートの打設を予定しています。

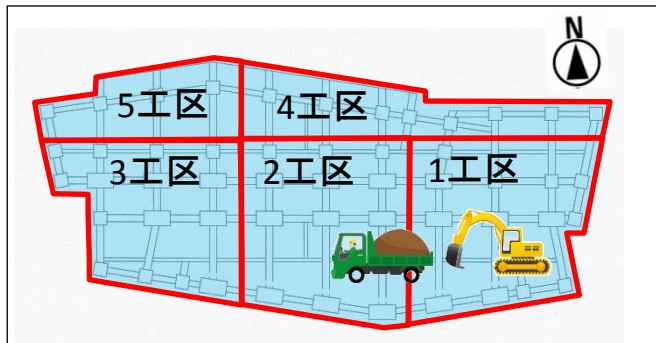

【①掘削工事】新庁舎の基礎工事のため、地下部分を約4m掘削していきます。（土が崩れないように周りを矢板で囲っています）



【②型枠工事】基礎コンクリートを打設する箇所に型枠を設置していきます。丸く見えるのは、杭の頭です。



【③捨てコン打設】捨てコンクリートは、鉄筋工事の位置を明示するため、コンクリートを打設するものです。



【④鉄筋工事】基礎となる型枠部分に鉄筋を配置していきます。（奥の工区では、掘削・型枠工事を行っています）
