

石岡市新庁舎建設工事
平成31年1月 利用開始予定

【進捗状況 No. 10】

平成30年9月28日現在


- エントランス鉄骨工事
- 各フロア内装・設備工事
- 車庫棟の建設工事

現在、正面エントランスの鉄骨工事及び3F構造木屋根工事を行っています。

B1Fでは造作家具工事が始まり、並行して各フロアの電気・機械設備工事や内装工事が進められています。



【庁舎南側】南側では外部足場の撤去が始まり、庁舎の外壁やガラス窓が見えてきました。コンクリート部分には、表面保護のための塗装が施されています。

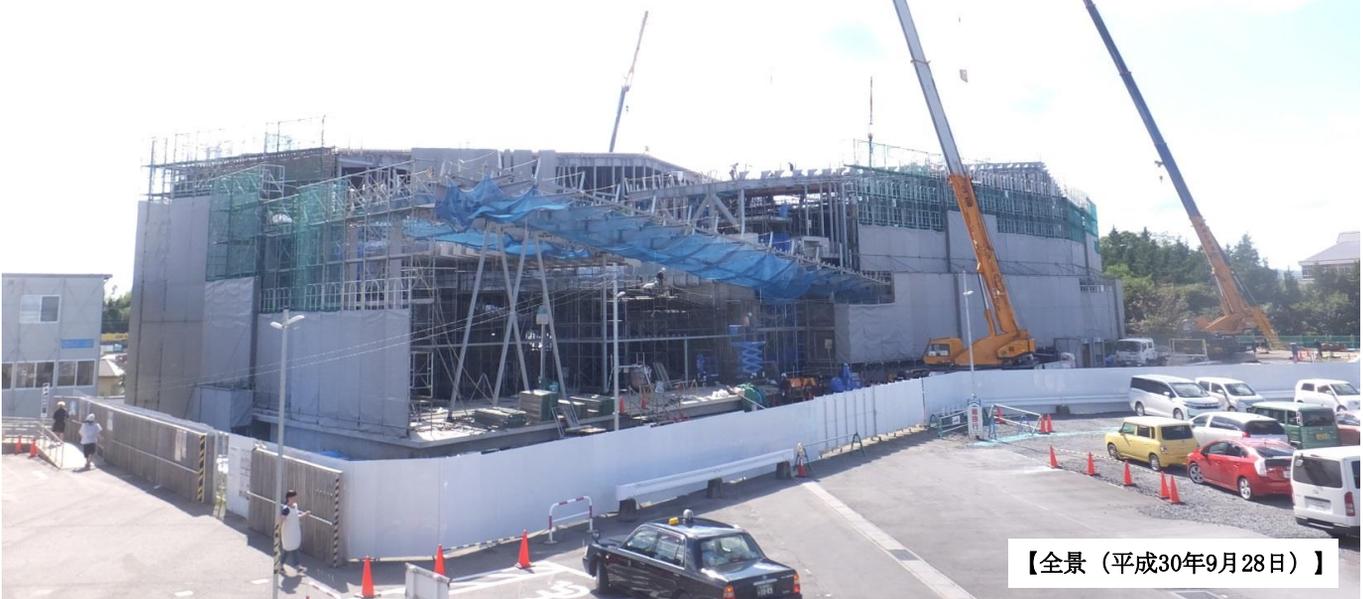

【全景（平成30年9月28日）】




【エントランス庇】

正面エントランスの庇が出来上がってきました。屋根と同じように木構造の天井になる予定です。



【B1F造作家具工事】

B1Fでは、造作家具工事が始まり、トイレや更衣室などの洗面台が取り付けられました。

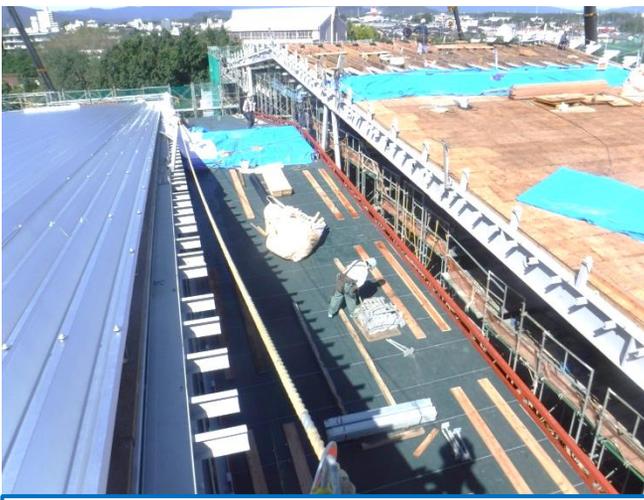

【中央屋根】

中央吹抜け部分の屋根工事を進めています。
天井部分は木構造となる予定です。



【ガラス取付け(3F)】

3F議会フロアのガラス窓取付け作業が始まりました。



【3F屋外機置場】

3Fの屋外に空調用の屋外機が設置されました。
防災用のアンテナ等も設置する予定です。



【車庫棟】

公用バスなどを駐車するための車庫棟です。
現在、鉄骨工事が進められています。



【さく井工事】井戸水を利用するため、さく井機による掘削工事を行っています。

<2つの給水源>

上水(水道水)と雑用水(井水)の2つの給水源を有効に活用することで、環境負荷の低減に努めます。また、井水は災害等で水道水が遮断された場合でも利用することが可能です。

【水道水】

上水として利用(冷水機、手洗い等)

【井戸水】

雑用水として利用(トイレの洗浄)
※災害時も利用が可能
